重点アクションプラン

■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備考
-			平成28	平成29	平成30	平成31	平成32	平成33	平成34	平成35	平成36	平成37	
施設整備	下水道	未整備地域の整備											市街化区域の下水道概成
	下水道（暫定浄化槽）												
	農集排												
	コミプラ												
実行メニュー（早期概成）	共通	低コスト手法による整備の実施											
		事業費の増加による整備期間の短縮の実施											事業費を5.7億/年から10.7億/年に増加

②目標値及び概算事業費等

		全体	流域関連公共下水道		集落排水施設	その他集合処理（公共事業）（コミプラ）	浄化槽		その他（民間設置集中浄化槽）	アクションプラン実行時の効果	備考
				暫定浄化槽			個人設置型	市町村設置型			
整備手法	整備人口　（人）	53,216	41,459	9,816	-	533	1,408	-	-		整備人口(～H37)
	※中段：アクションプランの整備人口数	(21,138)	(21,138)	(0)	-	(0)	(0)	-	-		アクションプラン期間内(H28～37)整備人口
	※下段：アクションプランの整備人口数　（流入人口）	(4,406)	(4,406)								アクションプラン期間内(H28～37)流入人口
	整備面積　（集合処理分）　（ha）	754	754	-	-	-			-		整備面積(～H37)
	※下段：アクションプランの整備面積	365	365	-	-	-			-		アクションプラン期間内(H28～37)整備面積
目標値	汚水処理人口普及率　（%）	87%	68%	16%	-	1%	2%	-	-	15.5%増加	コスト縮減の内容
	汚水未処理人口　（人）	7,984	0	7,984	-	0	0		-	10,312人減少	区域の見直しによる整備面積削減
											5.84億円
											区域削除による下流土被り緩和に伴う
計画区域内人口		61,200	41,459	17,800	-	533	1,408	-	-		施工法等変更　4.48億円
計画汚水水量　(m3/日)　※日平均		23,949	23,800		-	149					
計画汚泥量　(t/日)　※日平均		0	0		-				-		合計　10.32億円
概算事業費	流域関連公共下水道建設費　（百万円）	10,425	10,425		-	0		-	-		
	流域下水道建設費　（百万円）	3,873	3,873		-	0		-	-		年間整備費(H18～H27)　5億7千万円
	計	14,298	14,298		-	0		-	-		年間整備費(H28～H37)　10億7千万円
整備人口１人当たりの建設費　（千円/人）		560	560		-	0		-	-	効果	
実行メニュー	低コスト手法による整備の実施		○		-			-	-	低コスト工法の採用によるコスト縮減	
	事業費の増加による整備期間の短縮の実施		○		-			-	-	整備期間の5年短縮	中間年度(H32時点)の汚水処理普及率
					-						全体　82.3%
											下水道(暫定含む)　57.1%
											コミプラ　22.8%
											浄化槽　2.4%

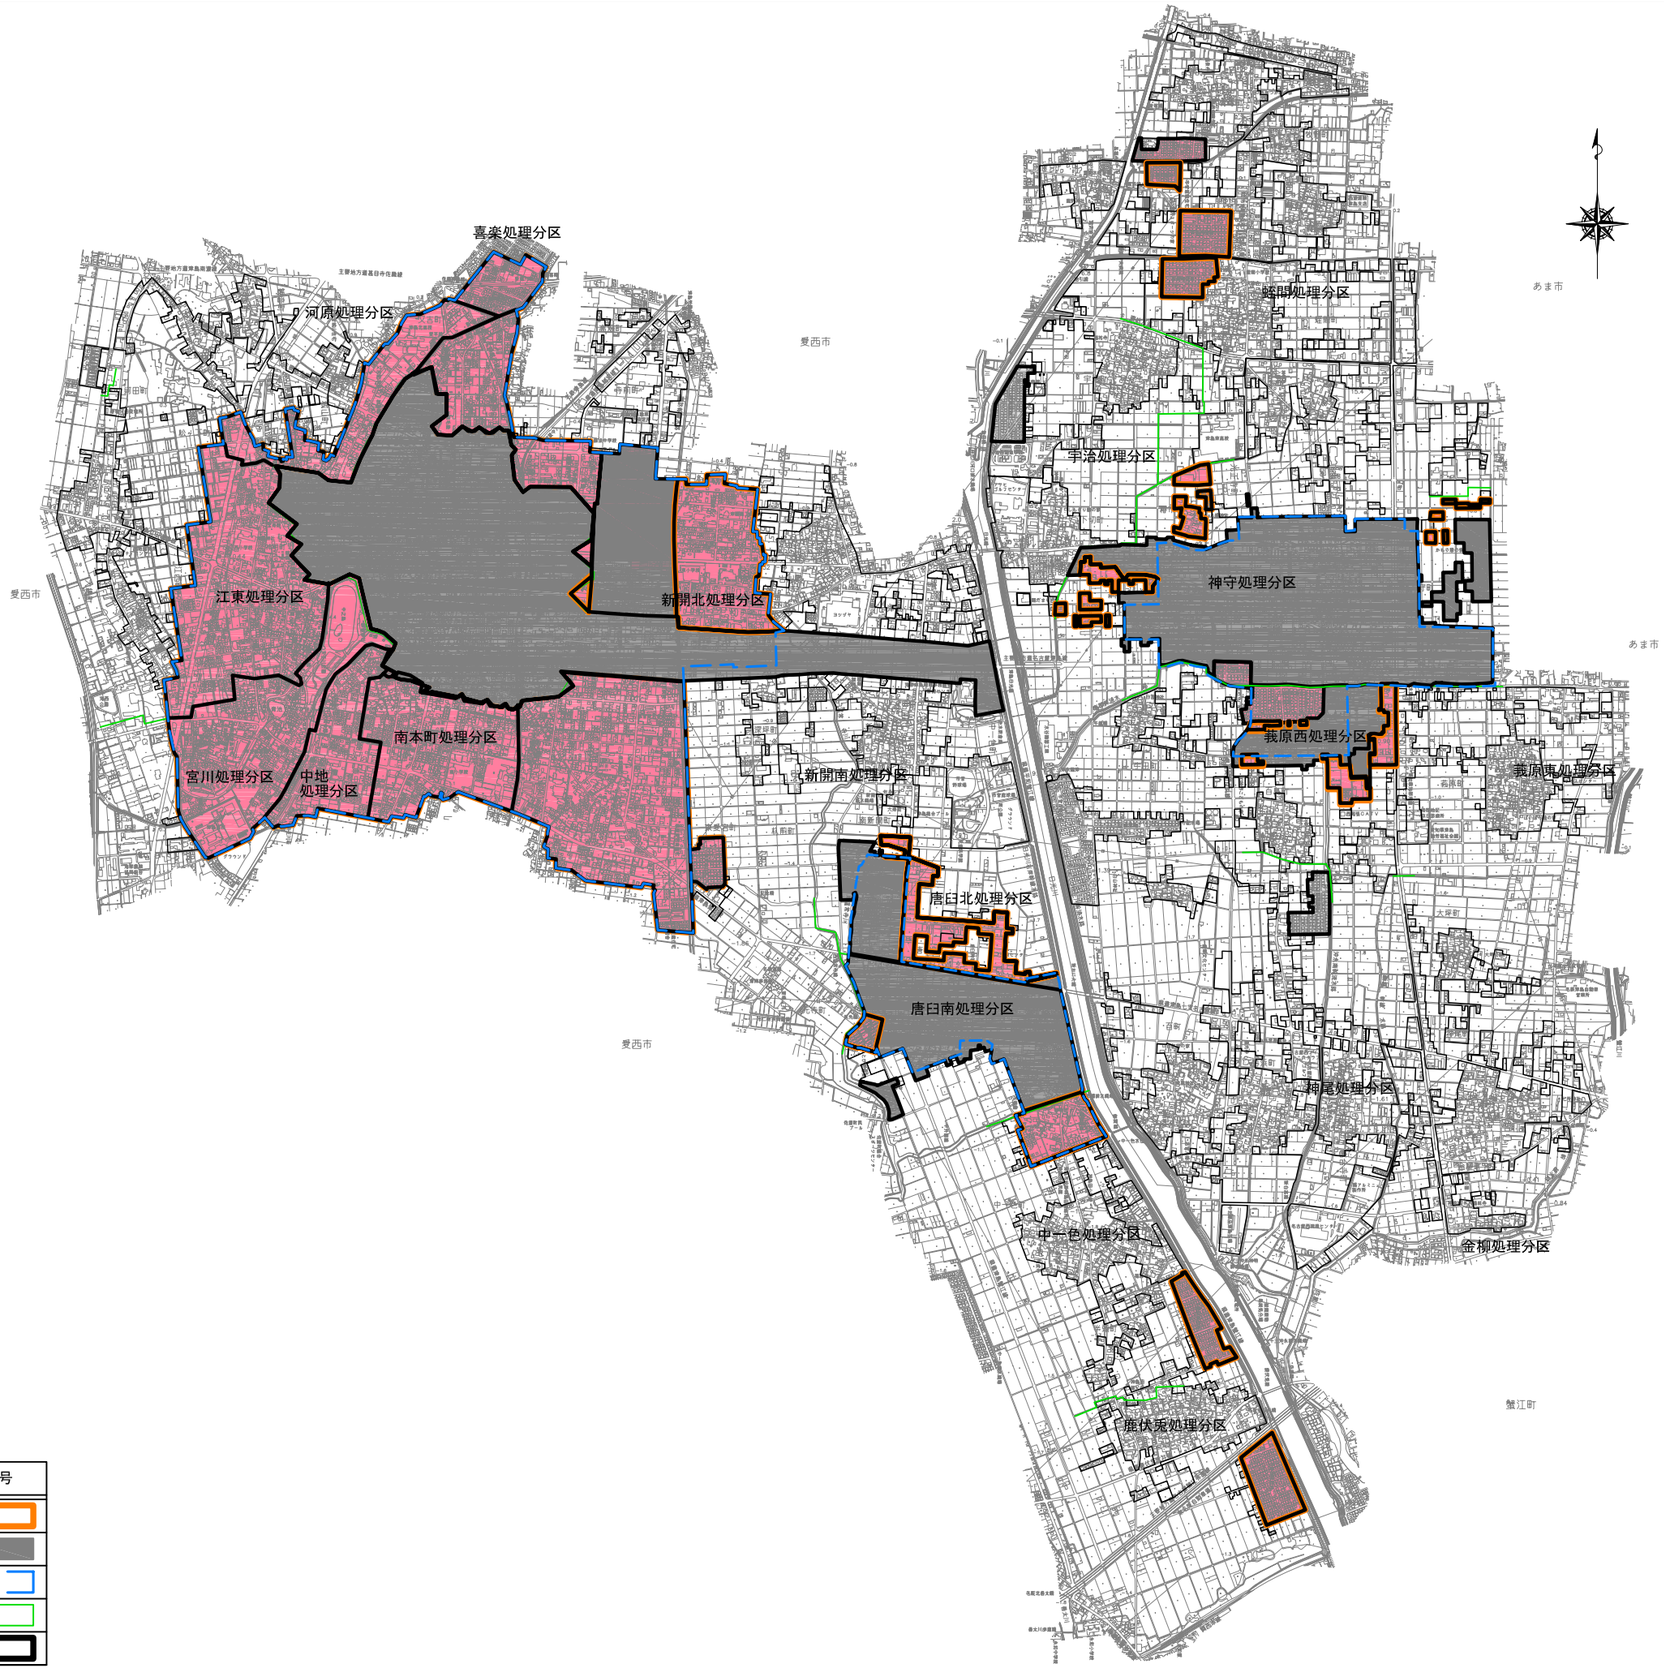

事業名	記号
平成37年度までに整備する区域	
既整備区域（2015年度末）	
市街化区域	
処理分区界	
下水道整備推進重点化事業区域	

流域関連公共下水道整備計画図

図面	下水道整備推進重点化事業区域図	図番	1
縮尺	1/30,000		1

津島市上下水道部下水道課
